avant...

La décharge s'étendait sur une superficie totale de 4 000 m², dont la moitié était occupée par des dépôts. Lors du diagnostic du site effectué en mars 2002, le dépôt occupait une superficie de 3 500 m² et atteignait une hauteur de près de 5 m en front de dépôt. L'accès au site était contrôlé par un gardien qui s'occupait de son entretien en même temps que celui de la déchèterie, attenante à la décharge et séparée par les déchets entreposés. La majorité des déchets étaient, en 2002, des matériaux inertes composés essentiellement d'encombrants (approximativement 40%), de gravats (50%), de pneumatiques (5%), de végétaux et de plastiques (5%). La commune de Bessan ne bénéficiait à cette date que d'un réseau partiel de collecte des ordures ménagères. Ainsi, les déchets ménagers des habitants ne bénéficiant pas de collecte étaient déposés à la décharge et brûlés dans une fosse aménagée à cet effet. L'ensemble des dépôts sur le site représentait, avant la réhabilitation, environ 7 500 m³.

...après

La réhabilitation a nécessité :
- la suppression des encombrants (200 m³),
- le reprofilage et le nivellement du dépôt (5 500 m²),
- le reprofilage des talus (sur 240 ml),
- la création d'un fossé périphérique permettant la collecte des eaux de ruissellement (sur 210 ml),
- la mise en place de la couche de fermeture en matériaux peu perméables (5 000 m³),
- la mise en place d'une couche de terre végétale (2 500 m³),
- la réalisation du compactage de la couche de finition,
- la dépose de la clôture existante sur 70 ml,
- le pompage des hydrocarbures,
- la mise en place de pierres pour fermer l'accès.

Livrée le 7 octobre 2005, le coût de la réhabilitation s'est élevé à 287 599,01 € TTC.

AUJOURD'HUI

La première des deux décharges de Bessan réhabilitée par le SICTOM voit surgir de terre une végétation issue de la flore du littoral méditerranéen, en l'emplacement même où quelques années auparavant, émergeaient des déchets.
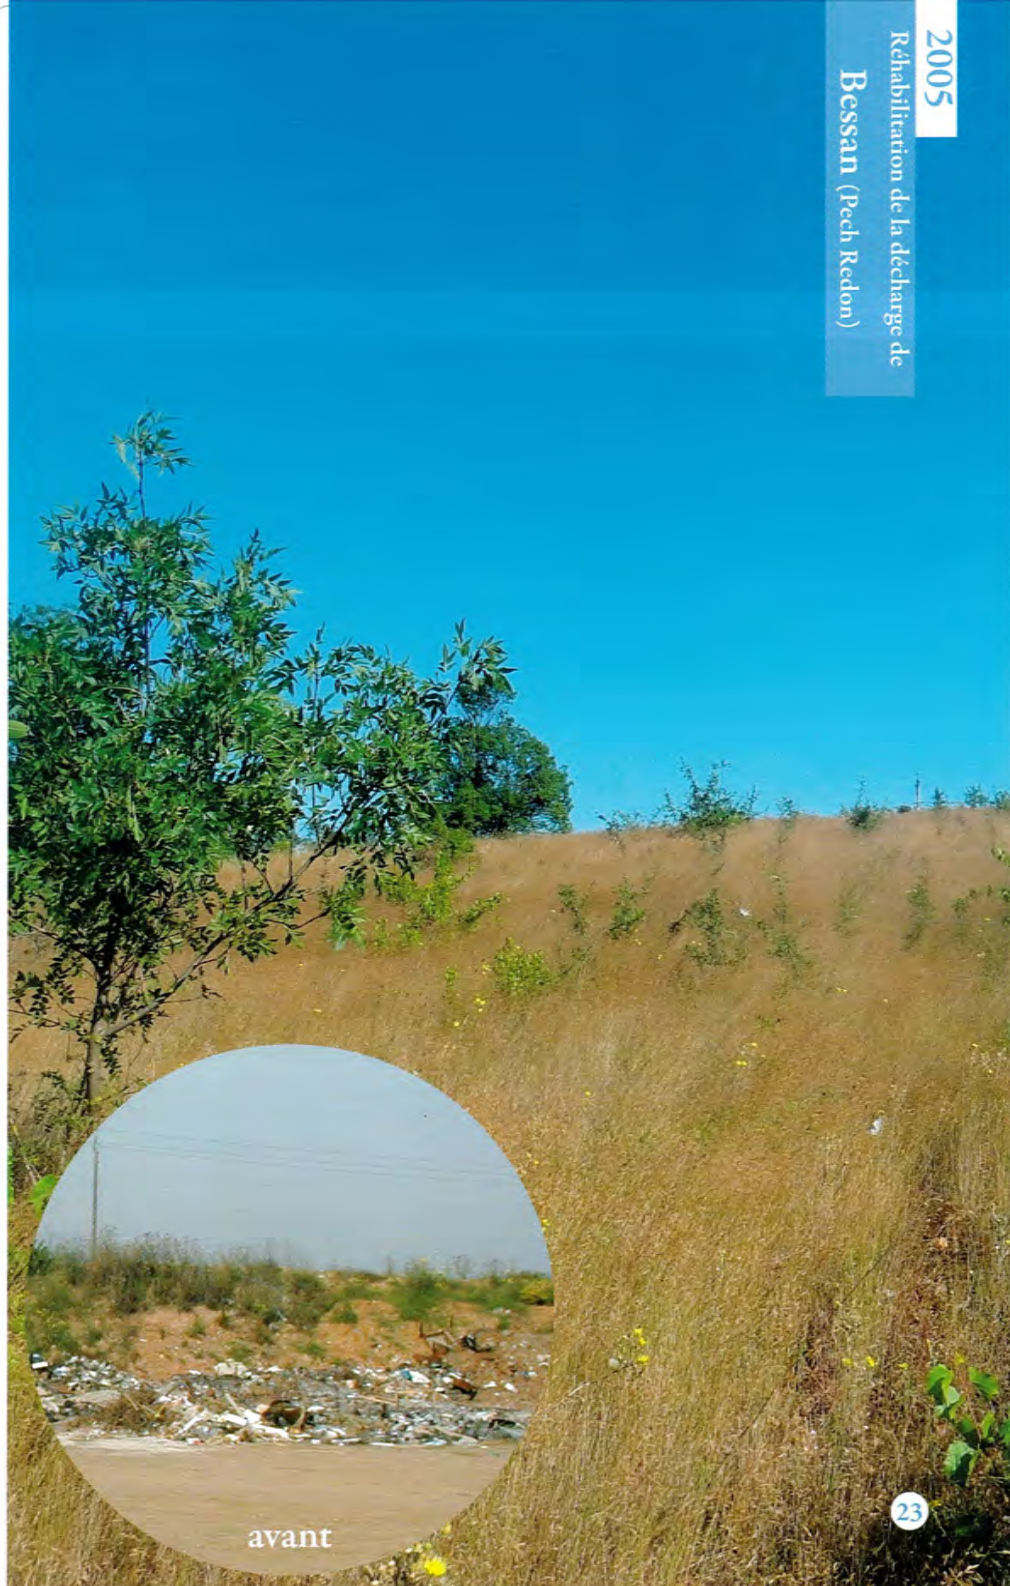
2005
Réhabilitation de la décharge de Bessan (Pech Redon)
